



PROJEKTNI SISTEM V TRIMU D.D.

Marko Preskar

marko.preskar@trimo.si





Vsebina predstavitve

- 1. Projekt jeklena montažna zgradba**
- 2. Inicializacija**
- 3. Planiranje**
- 4. Izvajanje in kontroliranje**
- 5. Zaključevanje**

Projekt jeklena montažna zgradba



Projekt jeklena montažna zgradba

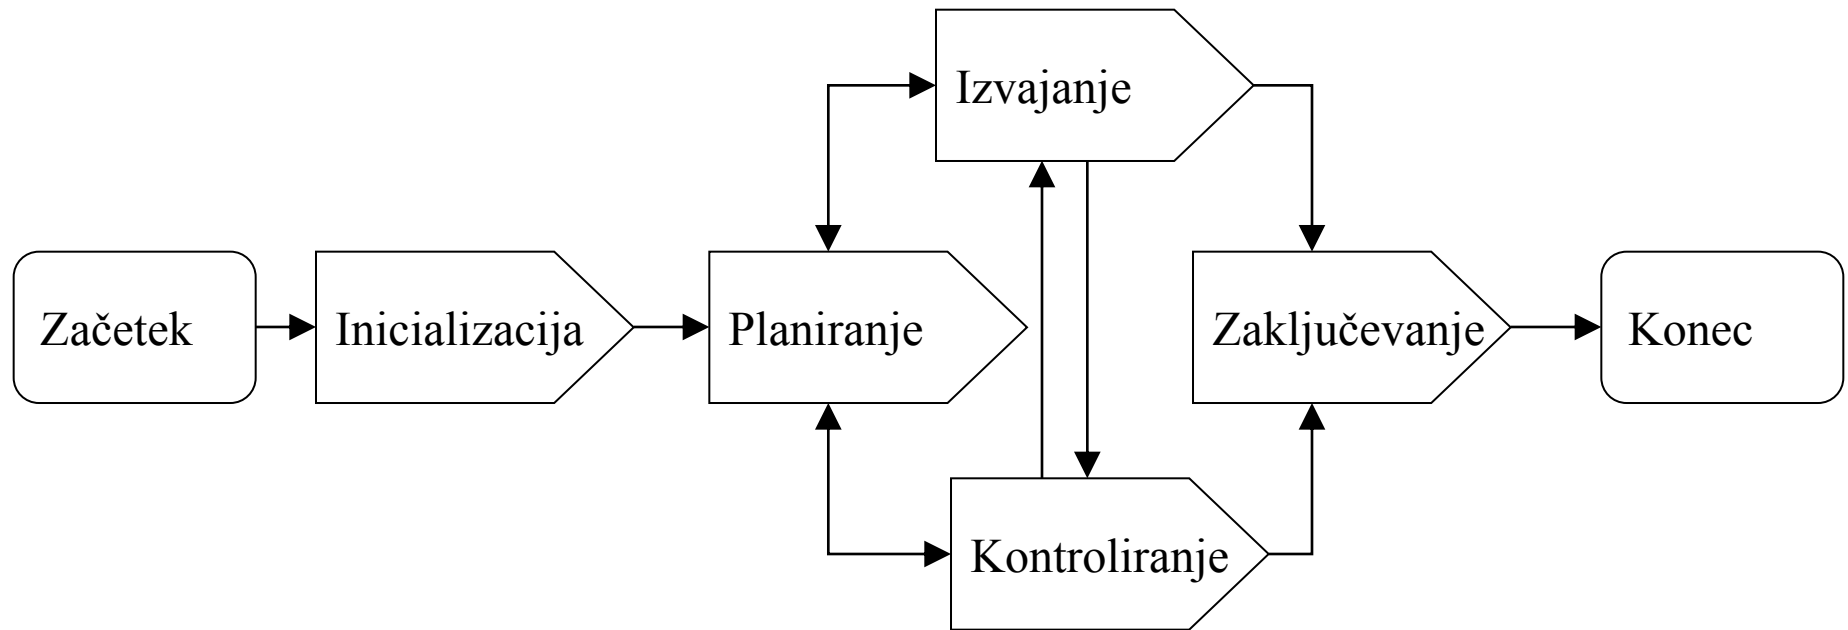

Project Management Institute

® Making project management indispensable for business results.®

Inicializacija

Proračun Obdelava Prehod Nastavitve Dodatki Sistem Pomoč

SAP

Sprememba originalnega proračuna: PPS pregled elem.

Def. proj.

Obdobje 0 Skupno

Pogledi v **WBS elementi** **Originalni proračun**

Skupne vrednosti

R...	Stp	PPS element	Pror.	Val...	Aktualni proračun	Planska vsota ...	Dodeljeno	Distrib
1		P-000122	539.936,78	EUR	539.936,78	166.871,33		539.
2		P-000122-01	539.027,10	EUR	539.027,10	165.928,20		539.
3		P-000122-01-01	12.983,76	EUR	12.983,76	6.086,43	9.738,66	
3		P-000122-01-02	307.386,80	EUR	307.386,80		3,63	
4		P-000122-01-02-0		EUR				
3		P-000122-01-03	162.648,30	EUR	162.648,30	158.543,77	25.089,42	
4		P-000122-01-03-0		EUR				
3		P-000122-01-04	1,00	EUR	1,00			
3		P-000122-01-08	1,00	EUR	1,00			
3		P-000122-01-09	1.298,38	EUR	1.298,38	1.298,00	1.298,00	
3		P-000122-01-10	54.707,86	EUR	54.707,86			

300 trt INS

trx. cj30
Kreiranje originalnega proračuna

Planiranje

Projekt: Obdelava Prehod Detalj Nastavitve Dgdatki Sistem Pomoč

Projekt: Sprememba

trx. cj20n
Planska tabla
Terminiranje

Projekt: P-000122

I	O	S	Oznaka	Sk	May '06	June '06	July '06	August '06	September '06	October '06				
					CW 21	CW 23	CW 25	CW 29	CW 31	CW 33	CW 35	CW 37	CW 39	CW 41
				05.										
		1												
		2	OSNOVNA POGODBA											
		3	PROJEKTIRANJE											
			PZI konst. JK											
			PZI statika JK											
			PZI oblog											
			Statika - OBL											
			ZUN Statika PGD/PZI											
			ZUN Konst. - JK											
			Koordinacija projekta											
			ZUN Konst. - OBL Streha											
			ZUN Konst. - OBL Fasade											
		3	PROIZVODNJA JK											
			Izdelava JK											
		4	O - PROIZVODNJA JK											
			storno											
			REZ KOO - P000122N000											
			REZ KOO - P000122N000											

Standardne vrednosti profil planske tabele: Sprememba

Opcije

- Terminiranje
- Planska tabla
- Aplikacija
- Predloge

Terminiranje

Scenarij terminiran. Parametri terminiranja, ki jih je mog

Oblika planiranja terminov za NSP-strukturo

Pl/osn trm 4 Strogo od spodaj navzgor (I) Plan./napo 4 Strogo od spodaj navzgor (I)

Parameter terminiranja za postopke

Prof. term. SČP	000000000001 Standardni profil - planir	Začet.v pretek.	300
Vrsta terminir.	1 Naprej	☒ Pril.osn.datuma	
OblikaTerminir.	X Mrežni plan določa termine	☐ Premik naloga	
		☐ Najkasn.komis.	
Maks.raven red.	6 Krčenje na nivo krčenja 6	☐ TermPriShranjev	
Vrsta redukcije	Vsi postopki naloga bodo reducirani		

Prevzem

Projekt: P-000122

400 trpci INS

Izvajanje in kontroliranje

Analiza stroškov - SAP NetWeaver Portal - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Reload Home Search Favorites RSS Mail Print W Yellow Blue People

Address  http://

Links  24ur.com - Naslovnica  SIOL.NET  Pozdravljeni v Gmailu  Google  Main Page - Wikipedia, the free encyclopedia  Univerze v Ljubljani

Dobrodošli TEST01, [Pomoč](#) | [Odjava](#) 

Iskanje [Razširjeno iskanje](#)

Poročila

TRIMO | Prodaja | Projekti | Nabava | Proizvodnja | Zaloge | Finance

Analiza stroškov Zgodovina [Nazaj](#) [Naprej](#)

Detajlna navigacija

- Analiza stroškov
- Podrobni stroški
- Rezultati nezaključenih projektov
- Prihodki
- Rezultati zaključenih projektov

Priključene portala

BEx ad hoc analiza

Analiza podatkov [Grafični prikaz](#) [Informacija](#) [Oddajanje informacije](#)

Z_0PS_C04_AnalizaStroškov Zadnja aktualizacija podatkov: 10.08.2007

[Shranjevanje pogleda](#) [Zaznamek](#) [Ekran variabel](#) [Izjeme in pogoji](#) [Komentarji](#) [Izvozi v Excel](#) [Izvozi v CSV](#)

	Trimo rezultat	Trimo ECP	Trimo Sk. dej. str	Trimo Plan. prihod.	Dejanski prihodek
Profil projekta	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
INVEST	20,54	82,71	36,74		
MARKET	43,70	81,80	43,70		
PROJEKT	86,51	55,47	73,91	17,52	54.282
PROJ_TI	64,72	37,45	75,32	24,34	18.582
Celotni rezultat	-4.267.215,47	57,43	29,67	41,86	72.864

Vrstice

Profil projekta   

Stolpci

Kazalniki   

Proste karakteristike

Definicija projekta   

Ključ države   

PPS element   

Poslovno leto/obd.   

Profitni center   

Vodja del   

Vrsta stroškov   

Done  Unknown Zone (Mixed)

Zaključevanje

**trx. cj20n
Tehnično
zaključevanje**

Status

Status sistema	LAN5	
Status uporab.	PR02	naro

Urejevanje projekta

Maska	P-000000-00-00-00-00-00	ID maske	
-------	-------------------------	----------	--

Pristojnosti

Odgovorni	5	Vodja projektne pisarne
Prošilec		

Organizacija

PodrKontrolinga	1000
Šifra podjetja	1010
Obrat	1010
Lokacija	
Profitni center	
Valuta projekta	SIT

Termini

Čas začetka	05.04.2006
Končni termin	01.10.2006
Tovarn. koledar	SL
Časovna enota	DAN
Začet.dat.napo.	10.04.2006
KončDat.napoved	28.04.2006

Delovni seznam **Predloge**

Predloge: Oznaka Identifikacija

- Posamezni objekti
 - PPS element
 - Mrežni plan
 - Postopek
 - Elem. postopka
 - Komponenta materiala
 - Mejnik
 - PS tekst
 - Dokument
- Projekti



Hvala za pozornost.
